



ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE



TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART DE LA VOIE EXPRESS

-Avant :


Route	Lot	Nbre. d'OA	Coût MDH	Avance. glob	Achèv. prévu	Observations
RR 505	1	3	33	76%	Mai 2016	-2 : Achevés -1 : En cours de travaux
	2	16	269	69%	Mai2016 (14OA) Déc2016 (2OA)	-5 : Achevés -9 : Travaux en cours -2 : En cours de relance ment (Marché résiliés)
	3	9	137	75%	Juin 2016 (3OA) Mai 2016 (1OA) Avril 2016 (1OA) Oct. 2016 (1OA) Juillet 2016 (2OA)	-1 : Achevé -8 : En cours de travaux
	4	7	110	40%(*)	Déc. 2016	-1 : En cours de travaux(*) -2 : En cours de lancement, -3 : Seront réaliser par l'Entreprise principal, -1 : En phase d'étude,
RN 2	1	3	54	98%	-	-3 :Achevés (sauf réfection ancien OA Oued Ghiss)
	2	3	41	11%	Fév. 2017	-3:En cours de Travaux
	3	6 1v	300	-	Juin 2018	-6 : Phase d'étude -1 Viaduc : Phase d'étude



-En cours:



SITUATION DES TRAVAUX

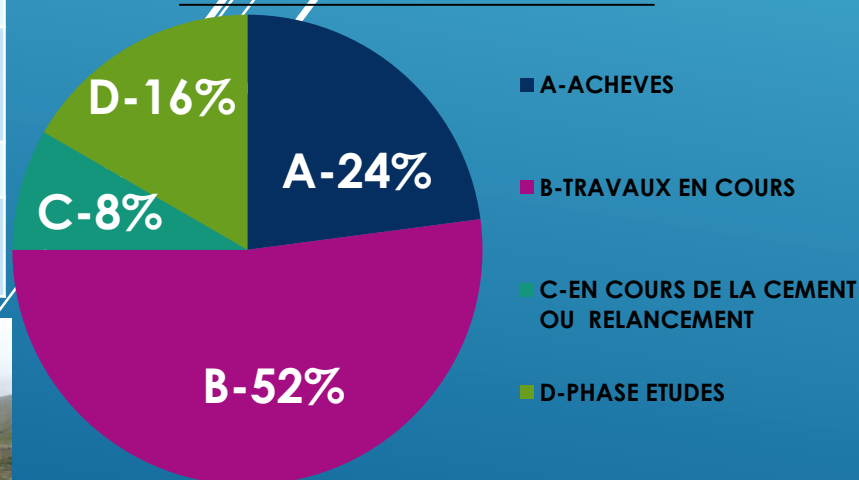

-Achevés:

